


福生都市計画事業 羽村駅西口土地区画整理事業  
令和2年度～5年度 整備実績（見込み）

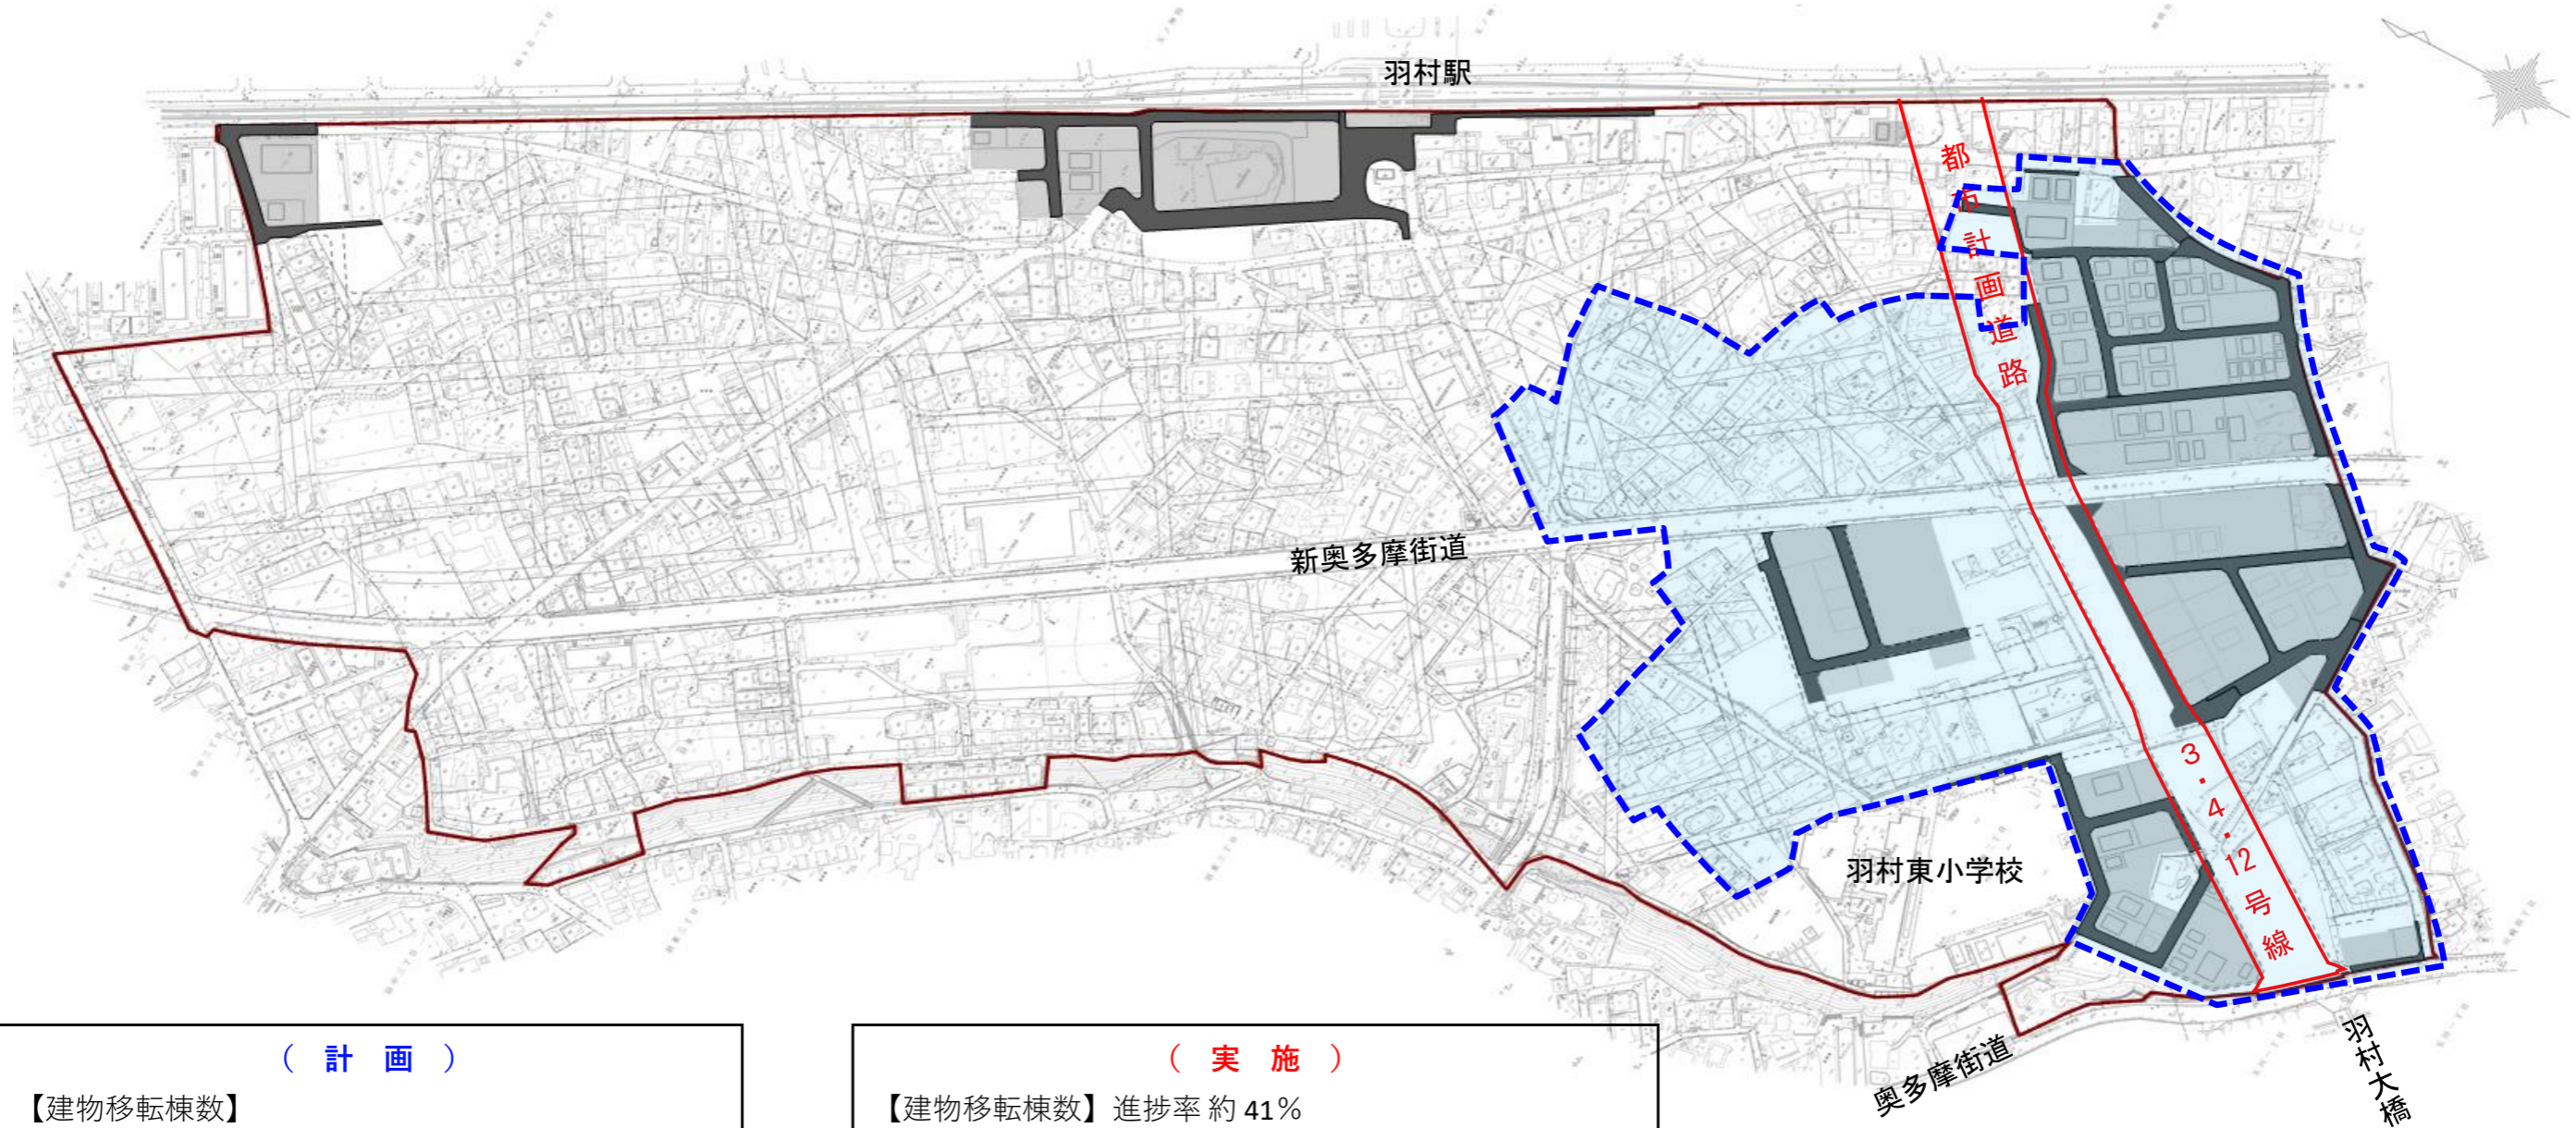

( 計 画 )

【建物移転棟数】

移転計画棟数 207棟

R2：43棟、R3：48棟、R4：51棟、R5：65棟

【道路築造延長】

区画道路整備計画延長 約 1,506m

【整地面積】

整地計画面積 約 35,123㎡

【事業費】

債務負担行為金額 7,857,200千円

( 実 施 )

【建物移転棟数】 進捗率約 41%

移転棟数 84棟

R2：36棟、R3：26棟、R4：13棟、R5：確定9棟

R5:協議中2棟

【道路築造延長】 進捗率約 56%

区画道路整備延長 約 843m

【整地面積】 進捗率約 56%

整地整備面積 約 19,767㎡

【事業費】 執行率 約70%

約5,520,831千円 (R2~R4は決算額、R5は予算額)



凡 例	
債務負担範囲 (R2-R5)	
過年度工事施工済箇所	
